

MOKSLINIŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ DARBŲ SUTARTIES, PASIRAŠYTOS TARP UAB „OGVY“ IR LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO 2009 M. GEGUŽĖS 14 D., PAPILDYMAS (3)

Vilnius

2014 m. rugpjūčio 19 d.

UAB „OGVY“, juridinio asmens kodas 300102047, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16a, Vilnius (toliau vadinama „Užsakovu“), atstovaujama direktoriaus Oliver Ortiz, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos istorijos institutas, juridinio asmens kodas 111955361, buveinės adresas Kražių g. 5 (toliau vadinama „Vykdytoju“), atstovaujamas direktoriaus Rimanto Miknio, toliau kiekviena atskirai gali būti vadinama „Šalis“, abi kartu „Šalimis“, sudarė šią tyrimų darbų sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. Šia sutartimi Užsakovas užsako, o Vykdytojas įsipareigoja šios sutarties nustatyta apimtimi atlikti mokslinius archeologinius tyrimus žemės sklype, kadastrinis Nr. 0101/0058:96 Vilniaus m.k.v., adr. Bokšto g. 6, Vilnius, vakariniame kieme ir buvusiame sode (380 m²) toliau vadinamame „Žemės sklypu“, teisės norminių aktų nustatyta tvarka parengti šių tyrimų dokumentaciją, ją suderinti ir aprobuoti kompetentingose valstybės ir/ar savivaldybės institucijose bei perduoti tyrimo rezultatus ir dokumentaciją Užsakovui. Šiame punkte nurodyti Vykdytojo atliekami mokslinių archeologinių tyrimų ir su tuo susiję darbai toliau sutarties tekste vadinami „darbais“.

1.2. Užsakovas įsipareigoja tinkamai ir laiku atliktus darbus bei darbų dokumentaciją priimti ir sumokėti už tai Vykdytojui šalių sudaryta atlyginimą.

1.3. Užsakovas pareiškia, kad ketina atlikti pastatų, esančių Žemės sklype, rekonstrukcijos ir kitus statybos darbus, todėl Užsakovui reikalinga gauti šiems darbams atlikti statybos leidimą. Vykdytojo pagal šią sutartį atliekami darbai užsakomi siekiant įgyvendinti teisės norminių aktų reikalavimus, nustatytus gauti statybos leidimą Užsakovui atlikti pastatų, esančių Žemės sklype, rekonstrukcijos ir kitus statybos darbus.

1.4. Vykdytojas pareiškia ir garantuoja, kad pagal šią sutartį atliekami darbai yra jo profesinė veikla; Vykdytojas (jo darbuotojai) turi reikiamą kvalifikaciją ir tai patvirtinančius visą šios sutarties galiojimo laikotarpį galiojančius atestatus, kvalifikacijos pažymėjimus, reikalingus darbams pagal šią sutartį atlikti.

1.5. Vykdytojas pareiškia ir garantuoja, kad gerai suprato Užsakovo užduotį, darbų užduotis jam aiški ir įgyvendinama, numatė ir įvertino visus darbus, kuriuos reikia atlikti užduočiai įvykdyti.

1.6. Užsakovas pareiškia, o Vykdytojas patvirtina, kad Vykdytojui yra žinoma, jog griežtas sutarties sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų atlikimo terminą, Užsakovui turi esminės reikšmės.

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. Užsakovo įsipareigojimai:

2.1.1. Vykdytojui atliekant darbus, organizuoti savo lėšomis Žemės sklype žemės kasimo, išvežimo iš pastatų ir teritorijos bei kitus panašaus pobūdžio darbus, išskyrus Vykdytojo atliekamus darbus, pagal Vykdytojo parengtą ir su Užsakovu raštu suderintą darbų atlikimo grafiką, kuriame būtų nurodyta Užsakovo organizuojamos darbo jėgos poreikis ir darbų mastas, reikalinga technika ir priemonės darbams atlikti bei laikotarpis, kuomet reikalinga Užsakovo organizuojama darbo jėga. Šiame punkte minimi Užsakovo organizuojami darbai vykdomi Užsakovo darbuotojų ar kitų trečiųjų asmenų pagal Užsakovo pavedimą. Užsakovas ar Užsakovo pavedimu – trečiasis asmuo, organizuodamas šiame punkte minimų darbų atlikimą, pateikia darbams atlikti reikalingą techniką ir priemones, organizuoja reikalingų darbo ir higienos sąlygų šiame punkte minimiems darbams atlikti sudarymą;

2.1.2. peržiūrėti ir priimti Vykdytojo tinkamai ir laiku atliktus darbus ir jų rezultatus bei dokumentaciją arba pateikti pastabas dėl atliktų darbų trūkumų;

2.1.3. laiku atsiskaityti su Vykdytoju už sutartyje nustatyta tvarka tinkamai atliktus ir priimtus darbus.

2.2. Vykdytojo įsipareigojimai:


2.2.1. organizuoti leidimo darbams atlikti gavimą, jį gauti teisės norminių aktų nustatyta tvarka bei darbų pagal sutartį vykdymo metu turėti galiojantį leidimą darbams atlikti. Vykdytojas, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, kad nėra jokių aplinkybių, dėl kurių buvimo Vykdytojui nebūtų išduotas leidimas darbams atlikti (moksliniams detaliesiems archeologiniams tyrimams);

2.2.2. darbus atlikti pats, neperduoti darbų atlikimo trečiajam asmeniui;

2.2.3. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios sutarties sudarymo dienos parengti ir su Užsakovu raštu suderinti darbų atlikimo grafiką, kuriame būtų nurodyta Užsakovo organizuojamos darbo jėgos poreikis ir darbų mastas, reikalinga technika ir priemonės darbams atlikti bei laikotarpis, kuomet reikalinga Užsakovo organizuojama darbo jėga;

2.2.4. nustatyti laiku kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui sutartyje nurodytus darbus, darbų rezultatą bei dokumentaciją, laikantis šiems darbams sutartyje bei užduotimi nustatytų reikalavimų, teisės norminiais aktais nustatytų reikalavimų ir sąlygų;

2.2.5. pateikti peržiūrėjimui ir tvirtinimui tyrimų dokumentaciją Užsakovui, o taip pat atlikti veiksmus, būtinus mokslinių archeologinių tyrimų dokumentacijos ruošimui, tvirtinimui ir statybos leidimo gavimui reikiamose valstybės ir/ar savivaldybės institucijose, vykdančiose projektavimo ir statybos priežiūrą, ar su kitais teisės aktų numatytais subjektais, išskyrus tuos atvejus, kai yra būtinas asmeniškasis Užsakovo dalyvavimas ar jo valios išraiška;



- 2.2.6. be papildomo apmokėjimo kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų ir/ar pareigūnų arba Užsakovo nurodytais terminais atlikti reikalingus mokslinių archeologinių tyrimų dokumentacijos pataisymus pagal kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų ir/ar pareigūnų pastabas, taip pat pagal Užsakovo pastabas;
- 2.2.7. vykdydamas šią sutartį, aktyviai bendradarbiauti su Užsakovu, apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo vykdyti ją šalių sutartomis sąlygomis, pranešti Užsakovui nedelsiant, net ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jų paaiškėjimo;
- 2.2.8. Vykdytojas neturi teisės be Užsakovo raštiško sutikimo perduoti darbų rezultato tretiesiems asmenims. Šis apribojimas galioja ir po sutarties įvykdymo, išskyrus šioje sutartyje ir įstatymuose numatytus atvejus;
- 2.2.9. atlyginti Užsakovui, kitiems asmenims dėl atliekamų ir/ar atliktų darbų nuostolius, atsiradusius dėl Vykdytojo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (netinkamo vykdymo, sutartyje numatytų darbų neatlikimo laiku), normatyvinių dokumentų pažeidimo, netinkamai parengtos dokumentacijos padarinių, tyčinės arba neatsargios veiklos (neveikimo);
- 2.2.10. vykdyti kitas šioje sutartyje numatytas, taip pat teisės aktų Vykdytojui pavestas pareigas.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymų pagal sutartį tvarka

3.1. Sutarties kaina – **83490 Lt** (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt litų), arba **24180,37 Eur** (dvidešimt keturi tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt eurų ir trisdešimt septyni euro ct) iš jos pridėtinės vertės mokesčiai (21 %) – 14490 Lt (keturiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt litų), arba 4196,59 Eur (keturi tūkstančiai šimtas devyniasdešimt šeši eurai ir penkiasdešimt devyni euro ct).

3.2. Jeigu siekiant įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Vykdytojas nenumatė sudarant sutartį, bet galėjo numatyti, tačiau jie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Vykdytojas atlieka savo lėšomis, Užsakovui tų darbų nekompensuojant. Darbus, kurių Vykdytojas nenumatė ir negalėjo numatyti, bet kurie turi būti atlikti, kad būtų pasiekti šios sutarties tikslai, Vykdytojas atlieka pagal atskirą šalių raštu suderintą sąmatą.

3.3. Sutarties kaina apmokama tokia tvarka ir dalimis:

3.3.1. **25 % (dvidešimt penki procentai)** nuo sutarties 3.1 punkte nurodytos bendros sutarties kainos dydžio dalis, t.y. 20872,5 Lt (dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt du litai ir penkiasdešimt centų), arba 6045,09 Eur (šeši tūkstančiai keturiasdešimt penki eurai ir devyni euro ct) sumokama avansu per 5 (penkis) darbo dienų nuo šios sutarties sudarymo dienos;

3.3.2. **60 % (šešiasdešimt procentų)** nuo sutarties 3.1 punkte nurodytos bendros sutarties kainos dydžio dalis, t.y. 50094 Lt (penkiasdešimt tūkstančių devyniasdešimt keturi litai), arba 14508,22 Eur (keturiolika tūkstančių penki šimtai aštuoni eurai ir dvidešimt du euro ct) sumokama dalimis, už Vykdytojo per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį atliktus Sutarties 4.1.1. punkte nurodyto etapo darbus, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo darbų priėmimo – perdavimo akto sudarymo ir atitinkamos PVM sąskaitos – faktūros ar kito atitinkamo buhalterinės apskaitos dokumento pateikimo dienos. Mokant už priimtus darbus, pirmiausia įskaitomas sumokėtas avansas, tačiau bendra sumokėtos kainos dalis, įskaitant ir sutarties 3.3.1 papunktyje numatytą avansą, negali viršyti 85 % (aštuoniasdešimt penkių procentų) sutarties 3.1 punkte nurodytos bendros sutarties kainos.

3.3.3. **15 % (penkiolika procentų)** nuo sutarties 3.1 punkte nurodytos bendros sutarties kainos dydžio dalis, t.y. 12523,5 Lt (dvylika tūkstančių penki šimtai dvidešimt trys litai ir penkiasdešimt centų), arba 3627,05 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt septyni eurai ir penki euro ct) sumokama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 4.1.2. punkte nurodyto etapo darbų rezultato ir darbų dokumentacijos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir atitinkamos PVM sąskaitos – faktūros ar kito atitinkamo buhalterinės apskaitos dokumento pateikimo dienos.

3.4. Atlyginimas Vykdytojui mokamas mokėjimo pavedimu į šioje sutartyje nurodytą Vykdytojo banko sąskaitą.

3.5. Vykdytojas, perduodamas Užsakovui darbus, kartu su darbų priėmimo – perdavimo aktu pateikia Užsakovui PVM sąskaitą – faktūrą ar kitą atitinkamą buhalterinės apskaitos dokumentą, išrašytą perduodamų darbų vertei.

4. Darbų atlikimo terminas. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

4.1. Darbai pagal šią sutartį turi būti atlikti ir darbai bei darbų dokumentacija, jei dokumentacija šiems darbams atskirai rengiama, turi būti perduoti Užsakovui tokiais etapais:

4.1.1. Visi lauko darbai Žemės sklypo plote ne vėliau kaip **iki 2014 m. gruodžio 31 d.** Darbų Žemės sklypo plote pradžios terminas pradėdamas skaičiuoti nuo 2012 m. liepos 2 d. Žemės sklypo schema su pažymėtomis darbų vykdymo vietomis pridedama kaip priedas Nr. 2.

4.1.2. visų darbų pagal Sutartį rezultatas bei visų darbų dokumentacija ne vėliau kaip **iki 2016 m. sausio 1 d.**

4.2. Dokumentacija turi būti įforminta ir sukomplektuota pagal teisės norminių aktų reikalavimus. Dokumentacija, tinkamai įforminta ir sukomplektuota bei aprobuota visų reikalingų valstybės ir/savivaldybės institucijų ar kitų subjektų, su visais teisės norminių aktų reikalaujamais pritarimais, patvirtinimais, suderinimais Vykdytojo turi būti pateikta Užsakovui 3 (trimis) egzemplioriais (įformina Vykdytojas).

4.3. Vykdytojui pateikus Užsakovui dokumentaciją, Užsakovas ją per dešimt darbo dienų išnagrinėja ir pateikia konkrečias rašytines pastabas, jei jų turi.

4.4. Užsakovui pateikus konkrečias pastabas dėl dokumentacijos, Vykdytojas įsipareigoja pašalinti nurodytus trūkumus ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo pastabų gavimo, jei šalys nesusitaria kitaip.

4.5. Nesant Užsakovo pastabų dėl dokumentacijos, laikoma, kad su šia dokumentacija Užsakovas sutiko ir šalių pasirašomas tos dokumentacijos priėmimo ir perdavimo aktas, kurį parengia ir kartu su PVM sąskaita – faktūra pateikia Vykdytojas, o Užsakovas pasirašo 3 (trijų) darbo dienų laikotarpyje ir 1 (vieną) pasirašytą bei antspaudu patvirtintą egzempliorių grąžina Vykdytojui. Jei Užsakovas nepagrįstai vengia ar atsisako pasirašyti priėmimo ir perdavimo aktą, Vykdytojas privalo pateikti Užsakovui rašytinę pretenziją ir nustatyti Užsakovui papildomą, ne trumpesnę kaip 3 (trijų)

darbo dienų terminą, akto pasirašymui. Per papildomą terminą Užsakovui nepasirašius jam pateikto akto, Vykdytojas įgyja teisę atlikti vienašališką dokumentacijos perdavimo aktavimą.

4.6. Pasirašyto priėmimo ir perdavimo akto pagrindu per 3 (tris) darbo dienas surašoma pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. Pažymą surašo Vykdytojas.

4.7. Jei šalys nesusitaria dėl atliktų darbų kokybės, šalys arba viena iš šalių gali kreiptis dėl atlikto darbo ekspertizės į Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentą. Šios institucijos ekspertizės išvada yra galutinė ir yra pagrindas baigti ginčą šalių susitarimu arba teismine tvarka. Ekspertizės išlaidas apmoka ta šalis, kurios nenaudai yra ekspertizės išvada. Šalys susitaria, kad ekspertizės išvados nebuvimas neatima teisės iš šalies tarp šalių kilusį ginčą spręsti teismo tvarka.

5. Sutarties šalių atsakomybė

5.1. Užsakovui sutartyje nustatytais terminais neapmokėjus už atliktus darbus, Vykdytojui raštu pareikalavus, Užsakovas privalo mokėti 0,01 % (vienos šimtosios procento) delspinigius už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, o Užsakovui uždelsus už pagal priėmimo – perdavimo aktą priimtus darbus atsiskaityti su Vykdytoju 5 (penkias) kalendorines dienas ir daugiau, Vykdytojui raštu pareikalavus, - padidintus delspinigius – po 0,1 % (vieną dešimtąją procento) už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

5.2. Vykdytojas atsako už netinkamą dokumentacijos parengimą, netinkamai parengtų dokumentų trūkumus ir dėl to patirtas bei su tuo susijusias išlaidas.

5.3. Vykdytojas, neatlikęs ir/ar šioje sutartyje nustatyta tvarka neperdavęs Užsakovui visų darbų ar jų dalies sutartyje nustatytais terminais, Užsakovui raštu pareikalavus, privalo mokėti 0,01 % (vienos šimtosios procento) delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo sutarties 3.1 punkte nurodytos bendros sutarties kainos, o darbus uždelsus atlikti ir perduoti 5 (penkias) kalendorines dienas ir daugiau, Užsakovui raštu pareikalavus, – padidintus delspinigius – po 0,1 % (vieną dešimtąją procento) už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo sutarties 3.1 punkte nurodytos bendros sutarties kainos.

5.4. Šaliai netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, Užsakovas pateikia Vykdytojui rašytinę pretenziją, nurodydamas protingą terminą trūkumams pašalinti, priklausomai nuo darbų ir trūkumo apimties. Vykdytojui per nurodytą terminą pažeidimo nepašalinus, Užsakovas turi teisę pareikalauti, o Vykdytojas privalo sumokėti Užsakovui 5'000 Lt (penkių tūkstančių litų) baudą už kiekvieną atskirai padarytą sutarties sąlygų pažeidimą.

5.5. Vienai sutarties šaliai padarius esminį sutarties pažeidimą ir po kitos sutarties šalies rašytinės pretenzijos per jos nurodytą protingą papildomą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos, šio pažeidimo nepašalinus, šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą nutraukti šią sutartį prieš terminą, po 7 (septynių) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie sutarties nutraukimą pateikimo kaltajai šaliai dienos. Šalys susitaria ir patvirtina, kad be kitų galimų esminio sutarties pažeidimo atvejų, esminiu sutarties pažeidimu yra laikomas Vykdytojo uždelsimas, dėl Vykdytojo kaltės ar dėl nuo jo priklausančių priežasčių, atlikti ir/arba perduoti darbus ar jų dalį ilgiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

5.6. Nutraukus šią sutartį dėl esminio jos pažeidimo, šalis turi teisę pareikalauti, kad kaltoji šalis sumokėtų 10 % (dešimties procentų) bendros sutarties 3.1 punkte nurodytos darbų kainos dydžio baudą.

5.7. Jei po šioje sutartyje numatytų darbų atlikimo ir jų perdavimo Užsakovui pagal nepriklausomų ekspertų ar teismo sprendimą paaiškėtų, kad darbai atlikti nekokybiškai, su trūkumais, Vykdytojas įsipareigoja per protingą ir įmanomai trumpą terminą šiuos trūkumus savo lėšomis pašalinti, o be to, atlyginti visus dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

5.8. Jeigu visų darbų priėmimo metu nustatyto ar vėliau išryškėjusių trūkumų, įrodytų nepriklausomų ekspertų ar teismo, Vykdytojas laiku neištaiso, Užsakovas turi teisę atsiskaityti iš sumų, priklausančių Vykdytojui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki tinkamo ja prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo arba jos nutraukimo anksčiau termino šioje sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka ir pagrindais.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą šalių raštinis susitarimu arba vienašališkai sutartyje ar įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

6.3. Sutartis gali būti keičiama ar papildoma tik rašytiniu šalių susitarimu. Toks susitarimas yra pridedamas prie šios sutarties kaip neatskiriama sudėtinė sutarties dalis.

6.4. Vienos ar kelių šios sutarties sąlygų negaliojimas nedaro negaliojančios visos sutarties. Kiekvieną negaliojančią šios sutarties sąlygą šalys įsipareigoja ekonomiškai priimtinausiu būdu pakeisti galiojančia taip, kad labiausiai atitiktų šios sutarties dalyką ir tikslus, taip pat būtų savo esme artimiausia negaliojančiai sąlygai. Jeigu paaiškėtų, kad viena ar kelios sąlygos yra būtinos šiai sutarčiai, tačiau nėra į ją įtrauktos, šalys įsipareigoja tokias sąlygas ekonomiškai priimtinausiu būdu įtraukti į šią sutartį taip, kad labiausiai atitiktų šios sutarties dalyką ir tikslus.

6.5. Ginčai, kylantys tarp šalių iš šios sutarties arba kitų, su ja susijusių teisinių santykių, sprendžiami derybomis siekiant sutarimo. Nepavykus išspręsti ginčo per vieną mėnesį nuo derybų pradžios, ginčas perduodamas spręsti teismui vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais pagal Užsakovo buveinės vietą.

6.6. Siunčiami pagal šią sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) pateikiami žemiau šioje sutartyje nurodytais šalių adresais.



Kopija tikra
Mokslinė sekretorė

Saulė Urbanavičienė

2017 m. 04 mėn. 03 d.

6.7. Siunčiami pagal šią sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminami raštu ir laikomi įteiktai tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu arba įvertintu laišku, faksimiliniu aparatu (patvirtinant gavimą) arba pristatyti šalių gyvenamosios vietos adresu kitomis priemonėmis, leidžiančiomis fiksuoti pranešimo išsiuntimą (patvirtinant gavimą).

6.8. Kiekviena sutarties šalis, pakeitusi adresą, telefono ir/arba faksimilinį numerį, nedelsdama apie tai informuoja kitą šalį. To nepadarius, pranešimas, pateiktas anksčiau nurodytu adresu ar faksimiliniu numeriu, laikomas įteiktu tinkamai.

6.9. Visi sutarties priedai, papildymai, pakeitimai yra sudėtinė neatsiejama sutarties dalis.

6.10. Ši sutartis sudaroma dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną yra perduodama kiekvienam iš sutartį pasirašančių asmenų.

6.11. Pridedama:

6.11.1. Priedas Nr. 1. „Žemės sklypo schema“.

Šalių adresai ir atsiskaitomosios sąskaitos

Vykdytojas:

Lietuvos istorijos institutas,
juridinio asmens kodas 111955361,
PVM mokėtojo kodas LT100001323314,
buveinės adr. Kražių 5, Vilnius,
a.s.Nr. LT057044060000960987,

AB SEB Vilniaus bankas,
banko kodas 70440,
tel. (85)26144436, faksas _____



Direktorius
Rimantas Miknys
A.V.

Užsakovas:

UAB "OGVY",
juridinio asmens kodas 300102047,
PVM mokėtojo kodas LT100001766419,
buveinės adr. J. Jasinskio g. 16A, Vilnius,
a.s.Nr. LT75 7044 0600 0482 0036,

AB SEB Vilniaus bankas,
banko kodas 70440,
tel. (85)2691995, faksas _____

Direktorius
Oliver Ortiz
A.V.



Kopija tikra
Mokslinė sekretorė

Saulė Urbanavičienė
20 11 m. 07 mėn. 03 d.



AB SEB bankas
Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 112021238
PVM mokėtojo kodas LT120212314
Laikotarpis nuo 2015-01-19 iki 2015-01-19

Lietuvos Istorijos institutas
Kražių g. 5-1, Vilnius, Lietuva
Įmonės /Asmens kodas 111955361

Sąskaitos LT05 7044 0600 0096 0987 | EUR išrašas

Data	Dokumento Nr. ir tipas	Mokėtojo arba gavėjo pavadinimas Mokėjimo paskirtis	Išlaidos	Pajamos
2015-01-19	1385 Lėšų įskaitymas	UAB "OGVY" LT75 7044 0600 0482 0036 300102047 Lėšų įskaitymas, Pagal atliktu darbu aktas Nr. 2 ir SF LIA Nr. 001749 Archeologijos tyrimai prie 2014.08.19 papildymas prie 2009.05.14 d. sutartis, dok. Nr. 1385, mokėtojas UAB "OGVY", mok. įm. / a. k. 300102047, mok. sąsk. LT757044060004820036 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420150119000300497514, pervedama suma 7254,11 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		7254,11 EUR 25046,99 LTL

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2015-01-19	3433,96 EUR 11856,78 LTL
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR 0,00 LTL
Iš viso, įplaukos:		7254,11 EUR 25046,99 LTL
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2015-01-19	10688,07 EUR 36903,77 LTL



Kopija iš: *[Signature]*



AB SEB bankas
 Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva
 Įmonės kodas 112021238
 PVM mokėtojo kodas LT120212314
 Laikotarpis nuo 2015-11-24 iki 2015-11-24

Lietuvos istorijos institutas
 Kražių g. 5--., Vilnius, Lietuva
 Įmonės /Asmens kodas 111955361

Sąskaitos LT05 7044 0600 0096 0987 | EUR išrašas

Data	Dokumento Nr. ir tipas	Mokėtojo arba gavėjo pavadinimas Mokėjimo paskirtis	Išlaidos	Pajamos
2015-11-24	1535 Lėšų įskaitymas	UAB "OGVY" LT75 7044 0600 0482 0036 300102047 Lėšų įskaitymas: Pagal atliktu darbu aktas Nr. 001850 Archeologijos tyrimai prie 2009.05.14 d. sutartis papildymas 2014.08.19d. Nr.3, dok. nr. 1535, mokėtojas UAB "OGVY", mok. įm. / a. k. 300102047, mok. sąsk. LT757044060004820036 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420151124000200303932, pervedama suma 3627,06 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		3627,06 EUR 12523,51 LTL

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2015-11-24	637,10 EUR 2199,78 LTL
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR 0,00 LTL
Iš viso, įplaukos:		3627,06 EUR 12523,51 LTL
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2015-11-24	4264,16 EUR 14723,29 LTL
Laisvai dispon. lėšos		4264,16 EUR 14723,29 LTL



a 15x3 m trench, the E edge touching the earlier excavated areas (Fig. 1). The investigation showed that the burials were concentrated only in the E part of the trench (Fig. 2), just several being unearthed in its centre. Six of the nine discovered burials were of infants or children (Fig. 4), three of adults. Just three burials contained grave goods, i.e. coins dating to the second half of the 17th century (Fig. 3), but the age and illnesses of the dead clearly attest to the especially poor state of their health, their inadequate nutrition, and the frequent traumas.

Irma Kaplūnaitė, Rytis Jonaitis

Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje 6


2014 m. LII MTS tęsė archeologinius tyrimus sklype Bokšto g. 6, Vilniuje (*ATL 2008 metais*, V., 2009, p. 149–157; *ATL 2009 metais*, V., 2010, p. 137–140; *ATL 2010 metais*, V., 2011, p. 129–134; *ATL 2011 metais*, V., 2012, p. 154–160; *ATL 2012 metais*, V., 2013, p. 199–204). Šiais metais detalieji tyrimai vykdyti visuose sklypo kiemuose. V kieme, buvusių garažų vietoje buvo tiriama perkasa 33 (perkasų numeracija tęstinė nuo 2009 m.), būsimo lifto vietoje prie korpuso 1D/1P buvo tiriama perkasa 34. R kieme, P dalyje, būsimos požeminės automobilių aikštelės vietoje buvo tiriama viena perkasa, kuri dėl didelio tyrimo ploto padalyta į perkasas 35A ir 35B. Taip pat šiame kieme, jo R dalyje įrenginėjant laikiną įvažiavimą į būsimą statybų aikštelę buvo tiriama perkasa 36 (1 pav.).

Tyrimų metu paaiškėjo, kad norint atlikti numatytus statybos darbus, reikia iširti papildomus plotus V kieme bei buvusiam vidiniame kiemelyje tarp korpusų 3H/1p ir H/1p. Čia,

būsimo kolektoriaus vietoje, buvo iširta perkasa 37. Norint įrengti požeminės stovėjimo aikštelės V sieną, buvo atlikti papildomi archeologiniai tyrimai buvusios tvoros, skiriančios R ir V kiemus, vietoje, tuo tikslu ištiriant perkasą 38. Taip pat prieš įrengiant būsimą požeminio SPA centro P sieną, buvo iširta perkasa 39. Be to, buvo baigtas tirti 2009 m. pradėtas tirti plotas, esantis V kieme, ties korpusu 2D/2p. Šis plotas pavadintas perkasa 40. Tačiau 2012 m. šiame sklype buvo iširtos 8 bendro 807 m² ploto perkasos.

2014 m. gavus leidimą statybos darbams, V kieme buvo nugriauti 4 tarybiniu laikotarpiu statyti garažai. Garažų vietoje iširta **perkasa 33** (170 m² ploto). Patogumo dėlei perkasa buvo padalinta į du nevienodo dydžio plotus – P ir Š. Nugriovus garažus ir nuėmus asfalto sluoksnį, ten, kur nebuvo perkastas garažo duobių, fiksuotas XX a. viduriu datuojamas akmenų grindinys. Jis fiksuotas ir ankstesnių tyrimų V kieme metu (2009 ir 2012 m.). Nuardžius grindinį ir paaiškėjus, kad žemės paviršiuje likę stiklinių buteliukų su neaiškiais chemikalais, iki 30 cm storio viršutinis sluoksnis nukastas mechanizuotai. Toliau tyrimai vykdyti ploto P dalyje.

Įsigilinus iki 50 cm, fiksuoti mūrinių pamatų fragmentai. Visi jie priklausė korpuso 4D/2p priestatui, nugriautam XVIII a. Fiksuotos vidinės šio priestato sienos, mūrytos iš raudonos spalvos plytų, rištų moliu. Dalis plytų su braukomis, antrinio panaudojimo. Taip pat aptikti pamatų fragmentai, mūryti iš rausvos spalvos plytų ir vidutinio dydžio akmenų, rištų kalkių skiediniu. Užfiksavus šiuos fragmentus, toliau buvo gilinamasi perkasos P dalyje. V dalyje pasiekus įžemį, R dalyje dar buvo fiksuotas perkasimo, atrasto 2012 m. perkasoje 29, tęsinys. Šis perkasimas iširtas iki galo. Jis buvo įkastas iki 2 m nuo buvusio žemės paviršiaus, datuojamas XVI a. pabaiga – XVII a.

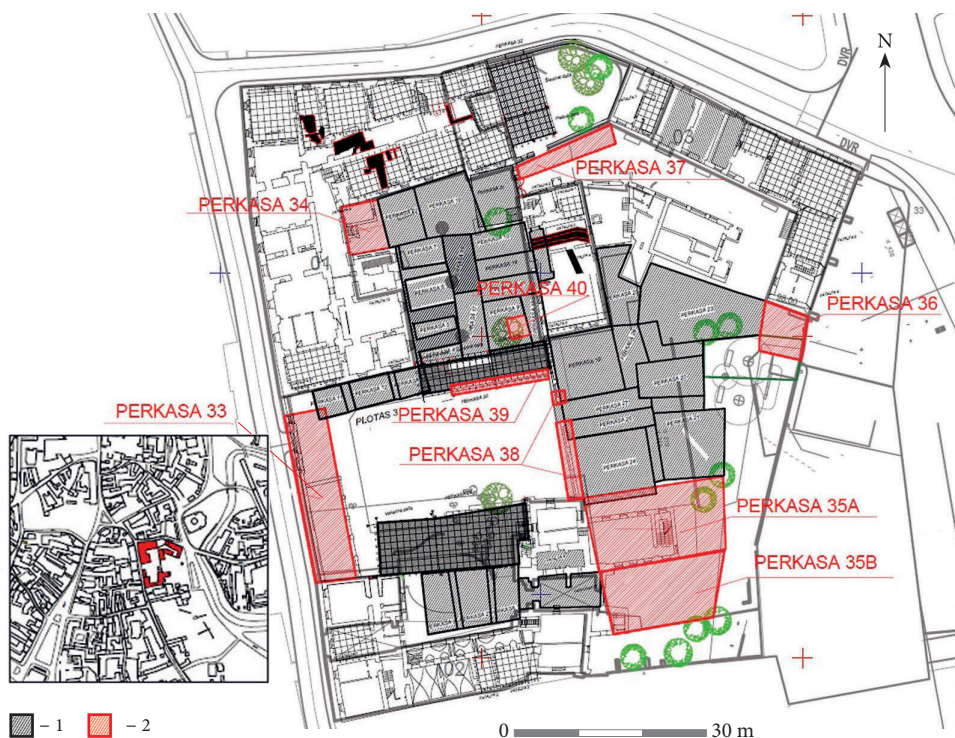

1 pav. Tyrimų Vilniuje, Bokšto g. 6, suvestinis planas: 1 – iki 2014 m. ištirti plotai; 2 – 2014 m. perkastos. I. Kaplūnaitės brėž.

Fig. 1. Synoptic plan of the investigations at Bokšto St. 6, Vilnius: 1 – areas excavated prior to 2014; 2 – the 2014 trenches.

Kitu etapu buvo tiriama perkastos Š dalis. 50 cm gylyje nuo esamo žemės paviršiaus aptikti XVII a. datuojami mūriniai medinių pastatų pamatų fragmentai, to paties laikotarpio grindinių liekanos. Perkastos V dalyje aptikta įrengta šiukšlių duobė. Jos sienelės buvo išklotos lentomis bei kalkėmis. Šiukšlių duobė datuojama XX a. pradžia.

Perkasa 34 (45 m² ploto) buvo kasama V kiemo Š dalyje, būsimo lifto įrengimo vietoje. Archeologinius tyrimus šioje vietoje sunkino

įvairių komunikacijų gausa. Tyrimai vyko dviem etapais: pirmuoju buvo kasama iki kapų horizonto perkastos Š dalyje, antruoju – preparuojami kapai ir gilinamasi perkastos P vietoje. P dalyje išryškėjo sudegusio stačiakampio formos pastatėlio kontūras. Š dalyje, kapų horizonte buvo ištirti 9 griautiniai kapai, dalis jų buvo suardyti tiesiant įvairias komunikacijas. Visi kapai be įkapių. Kapai datuojami kapinyno naudojimo laikotarpiu – XIII a. II puse – XV a. pradžia. Perkastos P dalyje buvo preparuojamas sudegęs pastatas. Šio perdegusio pastato sluoksnio storis buvo iki 50–60 cm. Sluoksnyje buvo itin daug grūdų, kurie surinkti (apie 40 litrų) ir paimti tolesniems tyrimams. Po perdegusiu pastatėliu, kuris datuojamas XVII a. viduriu, pasiektas žemės.



Perkasa 35 (415 m² ploto). Kaip minėta, patogumo bei saugumo dėlei perkasa suskirstyta į du plotus, kurie pavadinti perkasa 35A (Š dalis) ir 35B (P dalis). Viršutinis nevertingas šiukšlių horizontas (perkasa tirta buvusio nugriauto XIX a. fligelio vietoje) buvo nukastas mechanizuotai.

Ploto 35A (240 m² ploto) V dalyje įžemis fiksuotas 20–30 cm gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, tačiau į R perkasa labai gilėjo. 30–50 cm gylyje nuo esamo žemės paviršiaus fiksuoti nugriauto fligelio pamatai – tiek išorinių sienų, tiek vidinių. Centrinėje dalyje fiksuotas krosnies fragmentas, mūrytas iš rausvos spalvos plytų bei plytgalių, rištų molium. Nuo ploto centrinės dalies į R, Vilnios upės link, fiksuotas rudos spalvos su gausiomis organikos (skiedrų, mėšlo, odos) priemaišomis sluoksnis. Jame aptikta daug individualių radinių, pvz., auksinė grandinė, įtveriamasis peilis, odinės avalynės

2 pav. Kapai ir medinio užstatymo fragmentas perkastos 35B R dalyje iš R. R. Jonaičio nuotr.

Fig. 2. Burials and a fragment of a wooden structure in the E part of trench 35B, as seen from the E.

fragmentų, monetų, audinių plombos ir kt. Šis sluoksnis datuojamas XVI a. pabaiga – XVII a. Giliau fiksuotas smėlingas XVI a. sluoksnis. Ploto R dalyje, apie 6 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, įžemyje išryškėjo stačiakampio formos dėmės – kapų kontūrai. Čia, kur kas giliau negu kapinynas, aptikti 5 griautiniai kapai, dalis kurių suardyti. Mirusieji laidoti medinėse konstrukcijose, be įkapių. Įdomu tai, kad visi mirusieji orientuoti galvomis į Š–ŠR. Lieka neaišku, kodėl jie čia palaidoti. Gali būti, kad kapai čia atsirado nuslinkus dideliame žemės masyvui (reikia turėti omeny buvusį statų šlaitą ir tai, kad kapai labai žemai, palyginus su kapinynu), arba jie čia buvo specialiai palaidoti. Kol kas trūksta duomenų, norint atsakyti į klausimą,

kodėl kapai rasti tokioje vietoje. Ploto ŠR dalyje fiksuotas mūrinio pamato, aptikto 2011 m., tęsinys (kampas).

Plotas 35B (175 m² ploto) tirtas į P nuo ploto 35A. Viršutinis nevertingas sluoksnis buvo nukasamas mechanizuotai. Iš karto žemės paviršiuje išryškėjo neaiškios paskirties pilnavidurė gelžbetoninė konstrukcija – „postamentas“ (?). Viršutinėje dalyje ji ovalo formos, 2 m skersmens, apatinėje dalyje 4 m skersmens. Šios konstrukcijos paskirtis kol kas lieka neaiški. Sluoksnių eiliškumas ir stratigrafija tokie patys kaip ir plote 35A. Ploto PR kampe, tamsiai pilkos žemės sluoksnyje, 1,5 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus fiksuotas perkasimas, kuris pasirodė esąs medinio šulinio įkasimas. Pagal radinius šulinio viduje jis datuojamas XVIII–XIX a. Ploto R pjūvyje, rudos durpingos žemės horizonto apačioje, 6 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus fiksuotas neaiškios paskirties medinio pastato kampas (2 pav.). Į P nuo jo aptiktas medinės konstrukcijos iš horizontalių ir vertikalinių rąstų fragmentas. Vienas rąstas paimtas dendrochronologiniams tyrimams.

Ploto R dalyje nukasus juodžemio sluoksnių, esantį po ruda žeme, 7 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus buvo pasiektas žemės, kuriame išryškėjo kelių kapų kontūrai. Iš viso čia aptikti 7 griautiniai kapai (2 pav.). Dominuojanti laidojimo kryptis – galva į V, tačiau du kapai orientuoti galva į ŠV, vienas į PV. Kapai be įkapių, mirusieji laidoti medinėse konstrukcijose. *Kape 471* mirusiojo kojos fiksuotos gruntinio vandens paviršiuje. Jį preparavus po juo aptiktas *kapas 472*, beveik visas buvęs gruntiniame vandenyje. Deja, dėl didelės pjūvio nuslinkimo grėsmės (gruntinis vanduo, įsigilinta iki 50 cm į smėlį ir 7 m nuo esamo žemės paviršiaus), viso šio kapo preparuoti nepavyko – liko neišimtos kojos žemiau kelių.

Perkasa 36 (50 m² ploto) buvo kasama R kiemo R dalyje, įrengiant laikiną įvažiavimą į statybų aikštelę. Pačiame žemės paviršiuje, 20–40 cm gylyje, fiksuotas vidutinio dydžio akmenų grindinio fragmentas, kuris gali būti datuojamas XVII–XVIII a. Gilinantis toliau, iki 1 m gylio nuo esamo žemės paviršiaus, dalyje perkasos pasiektas žemės. Perkasos ŠR ir PV kampuose rastos akmenų, rištų moliu, konstrukcijos. PV kampe aptiktas pastato pamato (?) fragmentas, ŠR kampe taip pat fiksuota konstrukcija – pamatas ir krosnies fragmentas. Krosnis mūryta iš plytelių bei akmenų, rištų moliu. Aptiktos konstrukcijos datuojamos XVI a. pabaiga – XVII a.

Perkasa 37 (40 m² ploto) tirta vidiniame kiemelyje, esančiame sklypo Š dalyje. Nuardžius XX a. akmenų grindinį bei nukasus supiltinius vėlyvus tamsiai pilkos žemės horizontus, 0,6–1 m gylyje fiksuotas permaišytas kapų horizontas. Tyrimus sunkino čia esantys elektros kabeliai bei kiemelio viduryje tarybiniu laikotarpiu nutiestas kanalizacijos vamzdis (fiksuotas sklypo V kieme). Čia buvo aptikti 3 griautiniai kapai be įkapių, du iš kurių smarkai suardyti tiesiant komunikacijas. Šioje perkasoje fiksuotas kapinyno R ribos fragmentas, kuris sutampa su Vilnios upės terasos pakraščiu ir atitinka į Š ir į P buvusių perkasų tyrimų duomenis.

Perkasa 38 (33 m² ploto) buvo kasama abipus buvusios tvoros, skyrusios R ir V kiemus, pamato. Prieš tyrimus ši tarybiniu laikotarpiu statyta tvora buvo nugriauta. Tam, kad būtų nuolat veikiantis laikinas įvažiavimas į statybų aikštelę V kieme, pirmuoju etapu buvo tiriama perkaso P dalis, ją ištyrus – Š dalis. Centrinė dalis jau buvo iširta 2011 m. (perkasos 26 ir 27) (*ATL 2011 metais*, V., 2012, p. 158). P dalyje įsigilinus iki 60–70 cm, fiksuotas akmenų grin-

dinio su latakų fragmentas bei senieji tvoros pamatai. Grindinys preliminariai datuojamas XVII a., tvoros pamatas – XVIII a., kada buvo formuojamas dabartinis sklypo planas. Toliau tyrimai vyko tik ploto Š dalyje, kadangi P dalyje visi kultūriniai sluoksniai suardyti statant korpusą 4D/2p ir tvoros pamatą. Š dalyje pasiekus kapų horizontą aptikti 5 griautiniai kapai be įkapių. Kapų orientacija galvomis į V, karstų ar medinių konstrukcijų pėdsakų nepastebėta. Toliau buvo tiriama perkaso Š dalis, tiksliau, nedidelis (4 m² dydžio) plotelis. Iki pat žemio čia nefiksuota jokių struktūrų, išskyrus arkinį tvoros pamatą, kuris datuojamas XVIII a. Giliau fiksuoti 2 kapų horizontai. Viršutiniame iširtas vienas griautinis kapas be įkapių, apatiniame – 5 griautiniai kapai. Kapų orientacija galvomis į V, mirusieji laidoti karstus primenančiose medinėse konstrukcijose. Dviejuose apatinio horizonto kapuose buvo aptikta įkapių: viename – apgalvis iš metalinių skardelių ir du žiedai pinta priekine dalimi, kitame – apgalvis iš metalinių skardelių ir 3 žiedai pinta priekine dalimi (radiniai perduoti LNM Restauravimo centrai).

Perkasa 39 (55 m² ploto). Kaip dažnai statybose atsitinka, ne visada sutampa archeologų iširti ir realiai statybininkams reikalingi plotai. Taip buvo ir šį kartą – V kieme įrenginėjant požeminį SPA kompleksą, norint sugręžti P sienos polių, statybininkams prirėkė papildomos 1–1,5 m pločio juostos. Todėl šioje vietoje taip pat buvo atlikti tyrimai. Kadangi čia fiksuojamas kapinyno pakraštys, buvo aptiktas tik vienas griautinis vaiko kapas. Mirusiojo orientacija galva į V, įkapių nerasta.

Perkasa 40 (9 m² ploto) tirta po buvusią liepą, V kieme. 2009–2010 m. 1–1,5 m atstumu aplink liepą buvo paliktas netirtas plotas, aplinkui viską ištiriant iki galo (*ATL 2010 metais*, V,

2011, p. 130). Užsakovas tvirtino, kad ši liepa bus saugoma, tačiau prasidėjus statyboms, ją nuspręsta nukirsti. 2009 m. netirto ploto pjūvyje buvo palikti nepreparuoti 2 griautiniai kapai (fiksuotos tik kaukolės), todėl dabartinių tyrimų tikslas buvo visiškai juos preparuoti. Pasiekus kapų horizontą, be jau minėtų dviejų kapų, buvo aptikti dar 4 griautiniai kapai. Mirusiųjų orientacija galvomis į V. Visi kapai buvo be įkapių.

Apibendrinant 2014 m. tyrimus galima teigti, kad jie suteikė daug naujos informacijos apie čia buvusį kapinyną. Tai sietina su kapais, aptiktais už spėjamos kapinyno ribos. Taip pat papildyta šio kapinyno apgalvių bei žiedų kolekcija. Rasta ir iširta 40 kapų, datuojamų XIII a. II puse – XV a. pradžia. Taip pat šio sezono tyrimų metu buvo aptikti keli XVII a. akmenų grindinių fragmentai, to paties laikotarpio krosnių fragmentai, sudegęs medinis, veikiausiai ūkinės paskirties pastatėlis, XVII a. užstatymo pėdsakai tiek R, tiek V kiemuose. Taip pat kaip įdomų atradimą išskirtume XVI a. pabaigos – XVII a. durpingą rudos žemės sluoksnį R kieme, kuriame buvo aptikta nemažai įdomių to laikotarpio radinių.

The old cemetery at Bokšto St. 6

In 2014, the excavation, begun in 2006, continued at Bokšto St. 6, Vilnius. Trenches 33–40 (a total of 807 m²) were excavated (Fig. 1). The investigation yielded new and unexpected information about the Orthodox cemetery that existed at this site in the late 13th – early 15th centuries. This primarily should be connected with the burials discovered beyond the cemetery's suspected boundaries. Additions were also made to the collection of chaplets and rings from this cemetery. 40 burials from the second half of the 13th – early 15th centuries were dis-

covered and excavated (Fig. 2). The cultural layer that formed above the cemetery should also not be forgotten. Several 17th-century stone paving fragments, stove fragments from the same period, and traces of a 17th-century small burnt wooden building, probably an outbuilding, were discovered in both the E and W courtyards during this season. The late 16th–17th-century peaty red soil layer, which was in the E courtyard and contained many interesting finds from that period, also stands out as an interesting find.

Marius Petkus

Kartenos senkapis II

2014 m. gegužės–birželio mėnesiais Kartenos senkapio II, vadinamo Polverku (UK 6233), teritorijoje (Kretingos r., Kartena, Kretingos g. 43B) vyko detalieji archeologiniai tyrimai. Jų metu ištirta naujai suprojektuoto Kretingos g. 43B priestato pamato išorinė ir vidinė linija. Suprojektuoto pastato pamatų polių vietoje detaliųjų tyrimų metu ištirta 19 įvairaus dydžio (nuo 3x2 iki 16x2 m) perkasų. Bendras ištirtas plotas su išpjovomis siekia 254,4 m². Taip pat žvalgytos rekonstruojamo priestato polių vietos bei 205 m ilgio elektros kabelio tranšėja.

Kartenos vietovė pirmą kartą paminėta 1253 m. Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo žemių dalybų akte, ji priskirta Ceklio žemei. Kartena žinoma kaip svarbus žemaičių gynybinis kompleksas. Nuo 1568 m. minimas Kartenos kaimas. 1599 m. įsikūrė Kartenos dvaras, 1611 m. pastatyta evangelikų reformatų bažnyčia, 1634 m. – pirmoji katalikų bažnyčia. Iki 1940 m. tirtoje teritorijoje stovėjo Kartenos bažnyčios klebono ir kunigų gyvenamasis na-

mas, šalia buvo klebonijos ūkio pastatai ir ūkinis kiemas („polverkas“). Klebonijos ūkis buvo nacionalizuotas 1940 m., čia įkurtas J. Žemaitės kolūkis. Šiuo metu buvusio kolūkio pastatuose veikia UAB „Geralda“.

1987 m. senkapio teritorijoje tyrinėjo I. Jablonskis (*LIIR*, f. 1, b. 1360). Tyrimų metu buvo ištirtos trys 5x2 m dydžio perkasos. Perkasoje 1 fiksuotas 55 cm storio XX a. statybų metu susidaręs sluoksnis, po juo fiksuotas 30–40 cm storio dirvožemio sluoksnis. Perkasoje 2 fiksuotas 30–35 cm storio griuvenų sluoksnis, giliau – 40–50 cm storio sluoksnis su XVI–XVII a. keramika. Perkasoje 3 aptiktas tik 20 cm storio tamsaus grunto sluoksnis. Remdamasis tyrimų rezultatais I. Jablonskis senkapio teritorijoje lokalizavo Kalvinų bažnyčią, o rastus kaulus susiejo su šventoriaus palaidojimais.

2013 m. planuojamo užstatymo vietoje minėtame sklype buvo atlikti žvalgomieji tyrimai (*ATL 2013 metais*, V., 2014, p. 171–172). Jų metu buvo ištirtos šešios 5x2 m dydžio perkasos, iš viso 60 m² plotas. Perkasose 3–6 archeologiškai vertingų sluoksnių, struktūrų ar radinių neaptikta. Įžemis perkasose fiksuotas 0,5–1,5 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Perkasose 1, 2 aptikti mažiausiai 8 žmonių palaidojimai. Perkasoje 1 fiksuotos 5 kapų duobės, iš kurių visiškai ištirti du kapai, datuojami XVI a. pabaiga – XVII a. Perkasoje 2 fiksuotos 3 kapų duobės, kurios nebuvo tiriamos.

Perkasose 7, 11–13, 15–18 archeologiškai vertingų sluoksnių, struktūrų ar radinių neaptikta. Šiose perkasose po velėnos, paviršinio dirvožemio sluoksniais bei XX a. supiltiniais sluoksniais įžemis fiksuotas 0,6–1,8 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.

Perkasose 1, 8–10, 14, 19 55–75 cm gylyje nuo esamo žemės paviršiaus aptikti 9 palaidojimai, iš kurių 5 buvo nesuardyti (kapai 9, 11,
